
| 市町村・事業者名 | | 沖縄市 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|------------|---------------------------------------|-------|----------------|-----|---------|------------|--------------|--------------|----------------------|----------|---------------|--|
| | | 令和3年度 | (繰越)沖 | 縄振興物 | 特定事 | 業推 | 進費(| 市町 | [村)検 | 证: | ンート | | | | |
| | \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. | | | | | | | 担当部課名 | | | 企画部プロジェクト推進室 | | | | |
| 事業名 | | | 沖縄アリーナ整備事業 | | | | | 認定 | 認定市町村名 | | | | | | |
| 広域性要件または 先導性要件の該当 | Ø | 広域性要 | 件 現年 | 現年事業または繰越事業 | | | 現年 | 現年事業 | | 事業実施 | | A 7 1 | | | |
| 有無 | | 先導性要 | 件 | | | Ø | 繰越 | 事業 | (予定)年度 | | 年度 | 令和元 ~ 4年度 | | | |
| 事業内容 | プロスポーツ興行、コンサート、展示会等誘客の見込める催事の開催が可能な1万人規模の多目的アリーナを整備することで、入域観 光客数の増加を目指す。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 効果発現年度 | ☑当年度 □後年度(年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施方法 | ☑直接実施 □委託 □補助 □負担 □その他() | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | R1年度(繰越) | | | R2年度 | | R2 | R2年度(繰越) | | R3年度 | | R3年度(繰越) | | |
| | | 初予算額 | | | | 2,419,481 | | | | | 829,878 | | | | |
| | i | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算 | | 0 | | 0 | 2,419,481 | | 0 | | 829,878 | | 0 | | | |
| | の 状 | 前年度から繰越 | 2,702,000 | | 00 | 0 | | 480,299 | | 0 | | 683,635 | | | |
| 予算額· | 況 | | | | 0 | 480,299 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 執行額 【単位:千円】 | | 計 | 2,702,000 | | 00 | 1,939,182 | | | 480, | 480,299 | | 146,243 | | 683,635 | |
| (「補助金」+「市町 村負担」ベース) | 執行済額 | | 2,702,000 | | 00 | 1,939,182 | | | 472,892 | | 146,243 | | 672,470 | | |
| | うち補助金充当額 | | | 2,161,600 | | 1,551,345 | | 378,314 | | | 116,995 | | 537,976 | | |
| | 不用額 | | | 0 | | 0 | | | 7,407 | | 0 | | 11,165 | | |
| | 執行率(%)(B/A) | | 100.0% | | 0% | 100.0% | | | 98.5% | | 100.0% | | 98.4% | | |
| | 予算の状況の説明 | | 現地調査を踏 | 也調査を踏まえた避難経路の確保に伴う事業計画の変更が必要となり、繰越した。 | | | | | | | | | | | |
| | | 活動目標(指 | 活動目標(指標) | | | D1左连 | | | 達成状況 | | 況 R3年度 | | R4年度 | | |
| | 建設工事の実施 備品整備の実施 | | | 目標 | (| R1年度 実施) (| | (| R2年度 宇施 | R2年度 実施) | | 年度 -) | (| R4年度) | |
| | | | | 実績 | | 実施 | | | | | | | | | |
| 活動目標 | | | | 日標 | (| |) | (| |) | (身 | 実施) (| |) | |
| が期日保 (指標) 及び達成状況 | | | | 実績 | | | | (| | | | ·施· | | | |
| 20 EM NO | 達成。油乳工事については、食和 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 状況説明 | ・建設工事につい・円柱LEDビジョン | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 成果目標(指 | 票) | | | 集値 年度) | H30 | 年度 | R1年度 | F | R2年度 | R3年度 | | 目標値 (R4年度) | |
| | | 海岸(沖縄市、うるま市、北中城 | | 目標 | (1129 | - 1,2, | (| -) | (-) | (| -) | (- |) (| | |
| | 村、中城村、西原町)への入域観光客の 訪問率 | | | 実 績 | 15 | i.1% | | | | | | | | 16.7% | |
| | 成果目標(指標) | | | | | 集値 F度) | H30 | 年度 | R1年度 | F | R2年度 | R3年度 | | 目標値(年度) | |
| 成果目標 (指標) | | | | 目標 | | | (|) | () | (|) | (|) (| | |
| (指標) 及び進捗状況 | | | | 実績 | | | | - | <u> </u> | | • | | + | <u>`</u> | |
| | 進 技 状 況 説 明 | | | より、目標を | 達成でき | た。 | | | (沖縄市、う | うるま | 市、北中 | 城村、中均 | 基 | 、西原町)への | |

| 成果目標に対する原因・要因分析 | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点) |
|-----------------|---|
| | ・今後も、中部東海岸(沖縄市、うるま市、北中城村、中城村、西原町)への入域観光客の訪問率の向上のため、催事の開催に取り組む必要がある。 |
| | |

今後の取り組み方針

・引き続き、施設利用促進のため施設見学の実施や、安心して来場ができるよう施設入口に検温機や手指消毒用機器の設置徹底などに取り組む。

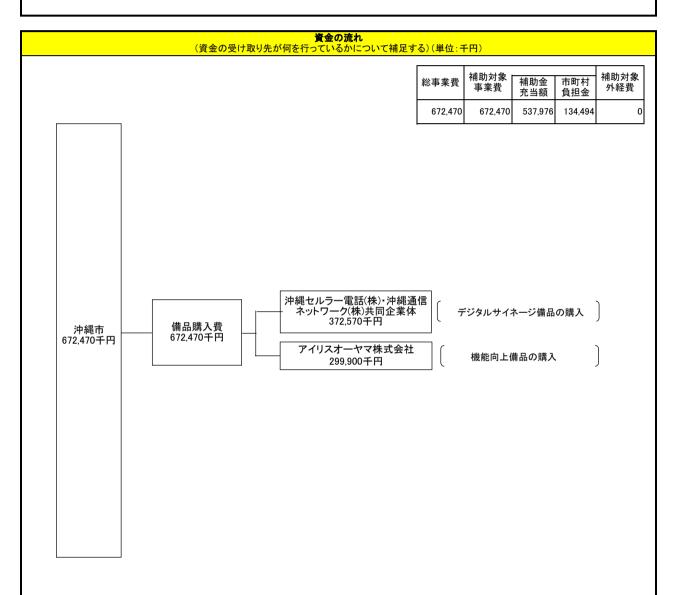

| | 評価 | 点 検 項 目 | 評価に関する説明 | | | | | |
|-----------------|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 使途の点検評価資金の流れ、費目 | 0 | 支出先の選定方法は妥当か。 | 契約の相手方は、入札、公募型プロポーザルによる選定及び地方自 治法の規定に基づいており、妥当であったと考えている。 | | | | | |
| | 0 | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | 不用額は事業費の10%以内であり適正な規模であった。 | | | | | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | - | | | | | |
| | 0 | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか | 費目、使途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、 必要なものであったと判断した。 | | | | | |
